

**Código: 36-0356**

**Título: ACTUACIÓN 70: REPARACIONES EN CATOIRA**

**Situación: Terminado (septiembre 2017)**

**PROBLEMÁTICA:**

Se han producido asentamientos en la senda construida sobre el relleno del trasdós del muro existente, que dificultan el drenaje por escorrentía en la senda, provocándose encharcamientos y filtraciones que perjudican la funcionalidad y la durabilidad de la infraestructura.

También existe un dique en mal estado, así como un tramo de rampa y escalera en el paseo de madera, cuya rehabilitación y adaptación accesible se ha solicitado al Servicio Provincial.

**ACTUACIONES:**

Nivelación de la rasante de la senda sobre el trasdós del muro, con aportación de jabre para facilitar el drenaje superficial.

Se rehabilita el dique y se sustituye un tramo de pasarela eliminando las escaleras y proporcionando un acceso en rampa con una pendiente más suave que la preexistente.

**PLAZO: 3 semanas**


**PRESUPUESTO: 14.712,58 €**

**COORDENADAS:**

**Zona: Huso 29**

**Abscisa: 522.479 m E**

**Norte: 4.724.642 m N**

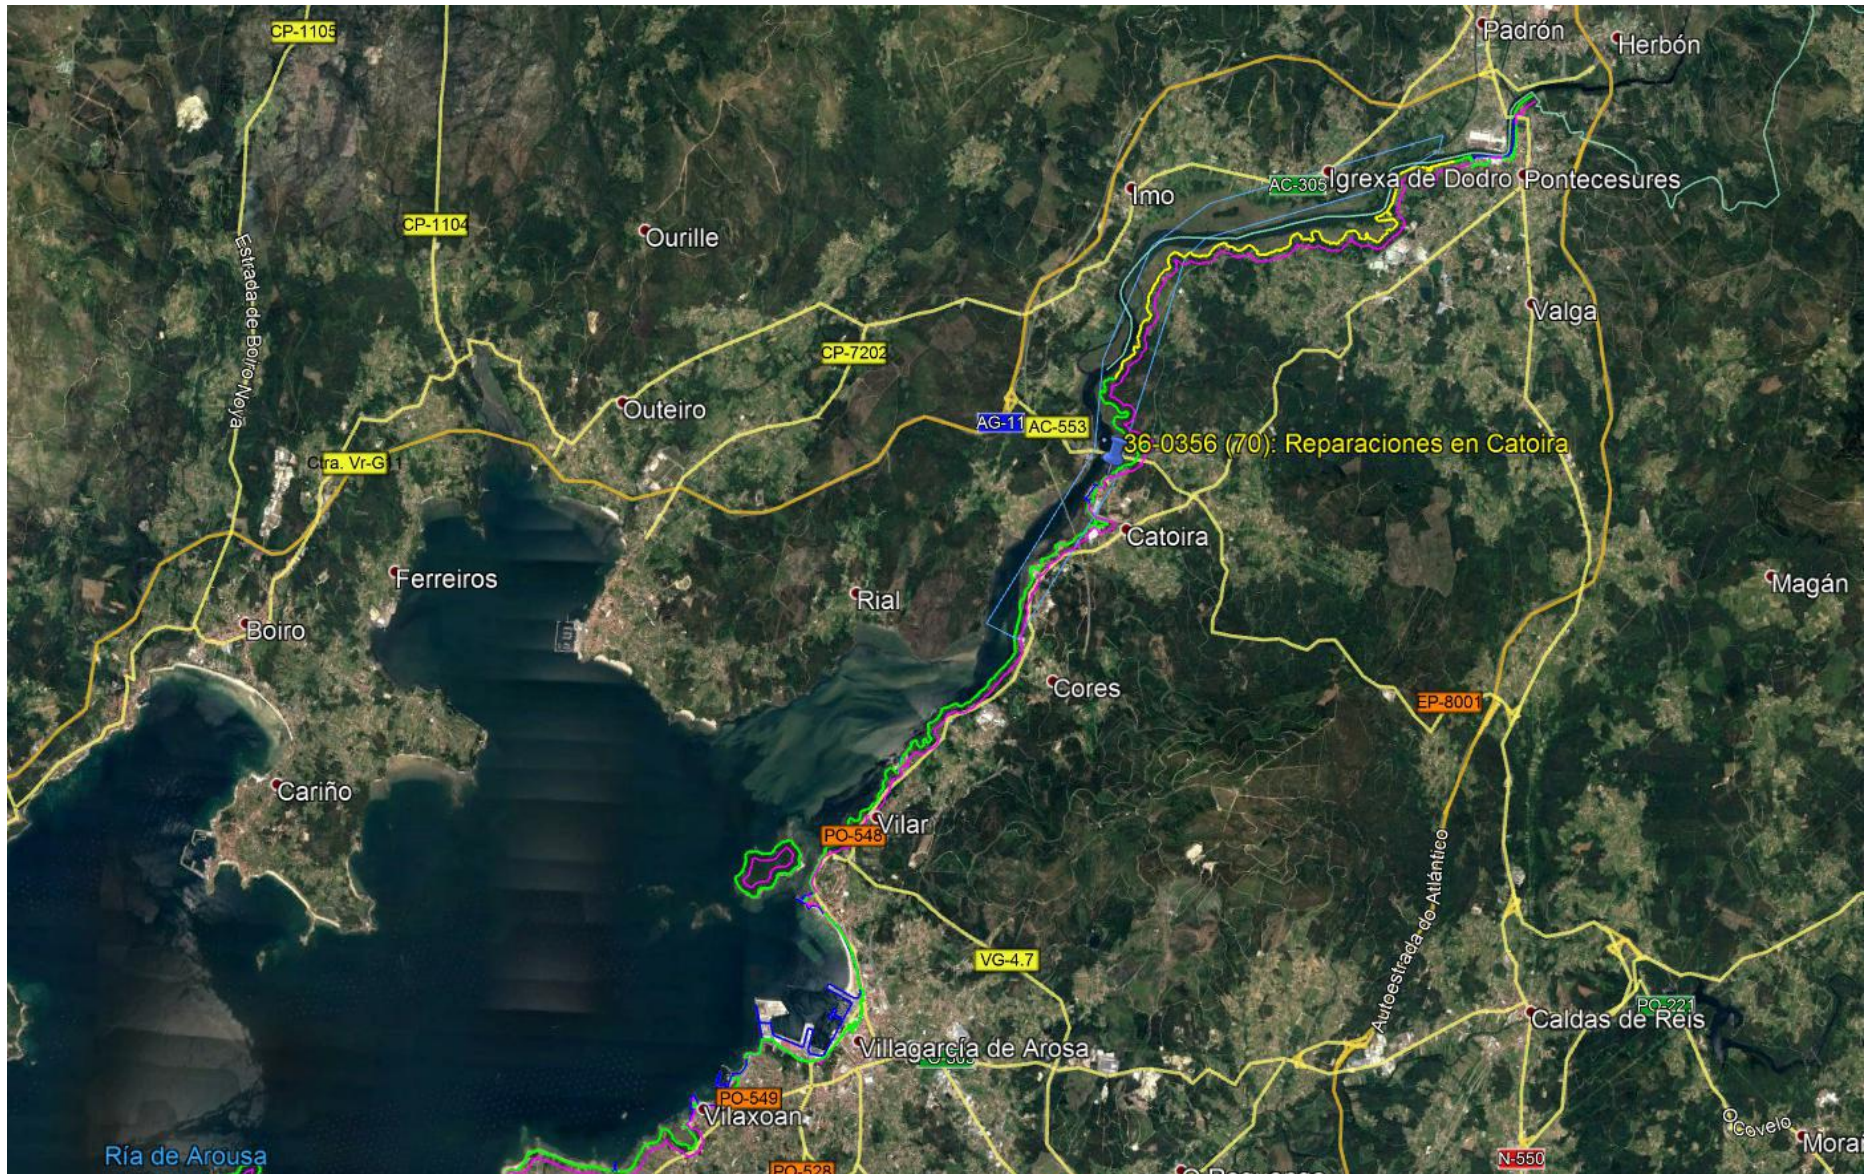





Antes de la obra



Durante la obra



Después de la obra
